



하나된 군민
풍요로운 복지영암

민선7기(2020. 12월 기준)

군수 공약사항 추진상황 평가



목 차

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. 평가개요 | 1 |
| 2. 평가(점검)결과 | 2 |
| ● 이행실태 분석 및 공약 추진율 현황 | |
| ● 연도별(분야별) 자원 현황 | |
| 3. 총 평 | 7 |
| 4. 향후계획 | 7 |
| 4. 참고사항 | 8 |
| ● 사업별 추진율 현황 | |
| ● 군민 모두가 행복한 복지영양 건설 | |
| ● 일자리 창출과 생동하는 지역경제 활성화 | |
| ● 생명산업과 최첨단 농업선도 | |
| ● 자동차튜닝산업과 경비행기 항공·드론산업 활성화 | |
| ● 역사문화관광·스포츠산업 집중 육성 | |
| ● 깨끗하고 쾌적한 일등영양 만들기 | |
| ● 조화롭고 활기 넘치는 지역균형 발전 | |

민선7기(2020. 12월 기준)

군수 공약사항 추진상황 평가

군민과의 소중한 약속인 민선7기 공약사업 100% 달성을 위해 민선 제7기 출범당시 약속한 공약사업에 대한 추진상황에 대한 평가 결과임

I 평가개요

- 근거 : 영암군수 공약사항 관리규정 제9조(추진상황 점검 등)
- 평가기준 : 2020. 12월
- 평가대상 : 7개 분야 58개 사업(임기 내 56, 임기 후 2)

| 임기내 | 임기후 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 국책 | 지자체 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| 56건 | 2건 | 27건 | 31건 | 56건 | 2건 | 1건 | 57건 |
| 97% | 3% | 47% | 53% | 97% | 3% | 1.7% | 98.3% |


II 평가(점검) 결과

- 이행실태 분석(2020. 12월 기준)

| 공약건수 | 추진율(%) | 추진 완료(27) | | 정상추진 | 부진 |
|------|--------|-----------|------|------|----|
| | | 종료 | 계속추진 | | |
| 58 | 76.9 | 21 | 6 | 28 | 3 |

- 공약 추진율(2020. 12월 기준)

| 분야 | 합계 | 복지 | 지역경제 | 농업 | 투닝항공 | 문화관광 | 환경 | 지역발전 |
|-------------|-------|-----|------|-----|------|------|-----|------|
| 중점과제 | 58건 | 15 | 4 | 14 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| '20. 12월 기준 | 76.9% | 73% | 60% | 86% | 70% | 53% | 87% | 96% |
| '20. 6월 기준 | 69.4% | 69% | 55% | 78% | 65% | 39% | 76% | 76% |

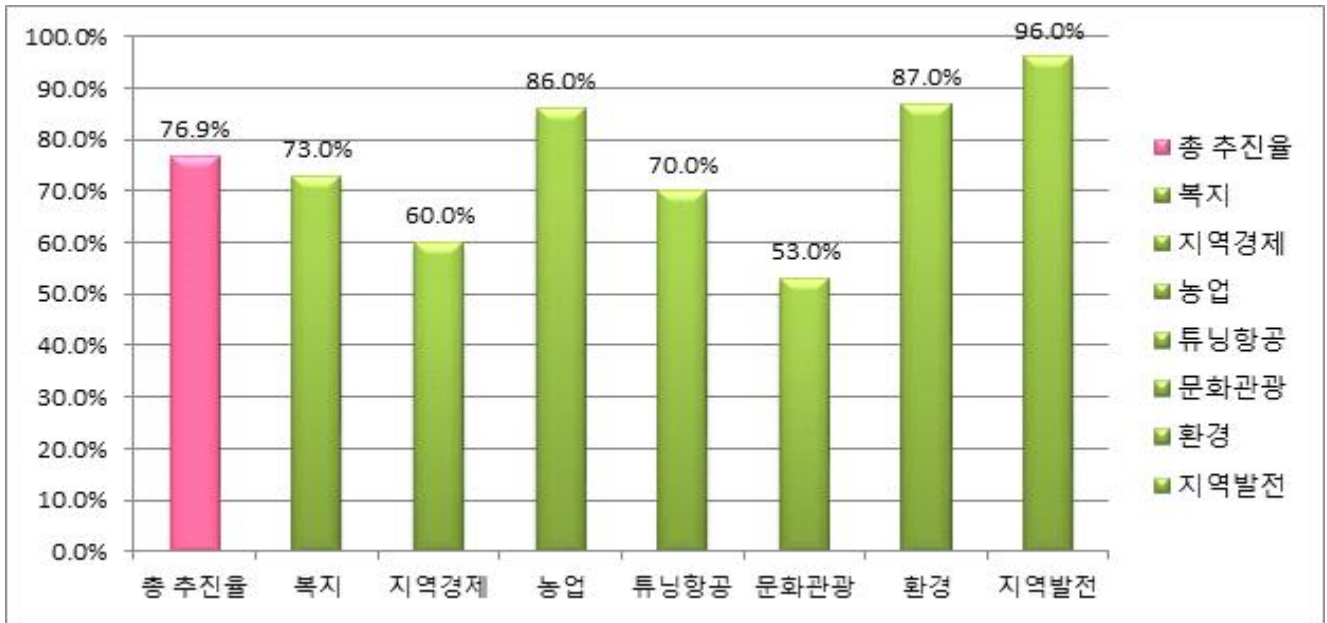


○ 민선7기 군수 공약사업 총 58개 단위사업 중 58개 사업 정상추진

□ 연도별 소요액

(단위:백만원)


| 구분 | 총사업비 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 임기후 |
|----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 합계 | 492,006 | 170,535 | 42,193 | 66,944 | 75,718 | 74,491 | 67,125 |
| 국비 | 204,595 | 100,477 | 13,313 | 27,755 | 26,749 | 13,743 | 27,558 |
| 도비 | 104,605 | 37,776 | 6,202 | 12,885 | 12,950 | 12,274 | 22,517 |
| 군비 | 107,145 | 20,345 | 19,811 | 19,670 | 30,619 | 15,086 | 1,615 |
| 기타 | 75,661 | 11,937 | 2,867 | 6,634 | 5,400 | 33,388 | 15,435 |

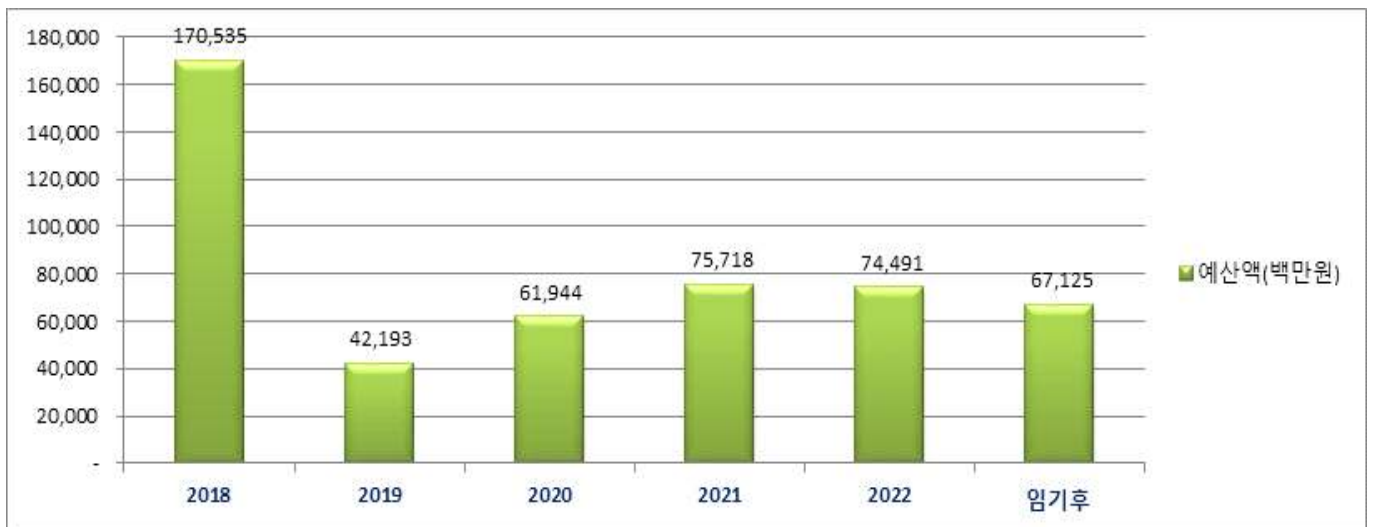

□ 분야별 소요액

(단위:백만원)

| 구 분 | 총사업비 | 복지 | 지역경제 | 농업 | 투닝항공 | 문화관광 | 환경 | 지역발전 |
|-----|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 합 계 | 492,006 | 42,971 | 33,116 | 46,865 | 291,500 | 36,240 | 17,189 | 24,125 |
| 국 비 | 204,595 | 6,921 | 11,879 | 30,995 | 125,150 | 16,070 | 1,871 | 11,709 |
| 도 비 | 104,605 | 659 | 1,190 | 833 | 99,200 | 25 | 1,720 | 978 |
| 군 비 | 107,145 | 35,369 | 18,637 | 9,697 | 460 | 20,145 | 12,898 | 9,939 |
| 기 타 | 75,661 | 22 | 1,410 | 5,340 | 66,690 | 0 | 700 | 1,499 |

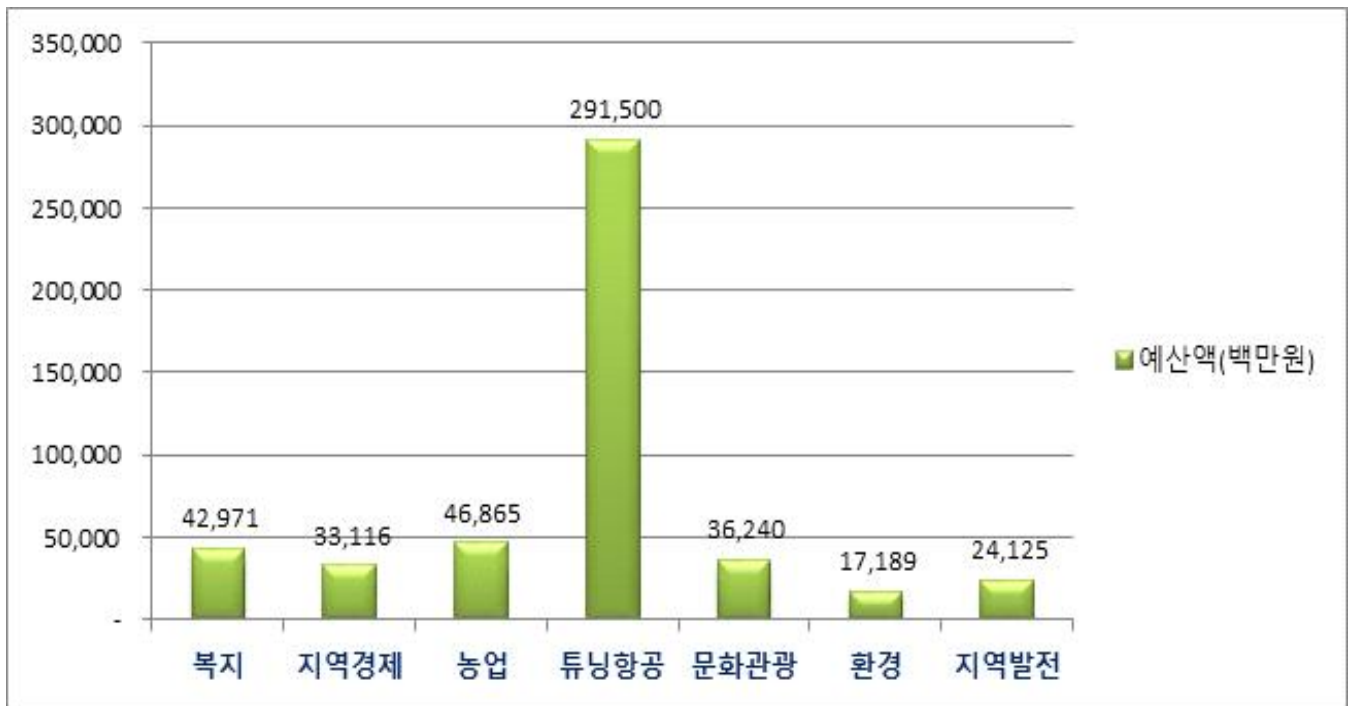

□ 투자실적

(단위:백만원)

| 구 분 | 총사업비 | 복지 | 지역경제 | 농업 | 투닝항공 | 문화관광 | 환경 | 지역발전 |
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|
| '20. 12월 기준 | 270,218 | 23,320 | 12,301 | 44,728 | 141,940 | 9,090 | 14,459 | 24,381 |
| 증액 | ↑ 7,070 | ↑ 42 | ↑ 3,572 | ↑ 405 | - | ↑ 548 | ↑ 2,504 | - |
| '20. 6월 기준 | 263,148 | 23,278 | 8,729 | 44,323 | 141,940 | 8,542 | 11,955 | 24,381 |

Ⅲ 총 평

- 7개 분야 58개 사업중 민선7기를 4년으로 감안할 경우 평균 추진율 62.5%를 초과하여 추진 중에 있으며 총 공약 추진율 76.9%에 270,218백만원이 투입 됨.
- 58개 사업 중 삼호도서관 증축 및 리모델링, 어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원, 치매안심센터 및 재활치료센터 신축, 농어촌 의료서비스 개선, 중·고등학교 신입생 무상교복 지급, 자동차 튜닝 기술자 양성, 벼 건조저장시설(DSC)확충, 들녘경영체 육성(다각화), 잔류농약 분석실 설치, 농기계 임대사업소 북부분점 신축, 축산과 신설, 도로 재비산먼지제거 차량 구입 청정영암구현, 농산물종합가공센터 건립, 신북면농촌중심지 활성화사업, 도포면 도포권역 종합정비사업, 금정면 금정지구 농어촌 지방 상수도 개발 등 27건이 완료되었으며 31건의 공약들은 차질 없이 추진되고 있음
- 트로트 창작센터 건립, 영암군 민속씨름 종합체육센터, 삼호 어울림 문화체육센터 건립(어린이 종합문화센터) 등 3건의 사업이 사업 재검토 및 행정절차 등을 거치면서 추진 실적이 저조함. 향후, 군정주요업무 보고 등 각종 보고회 및 자체점검을 통해 군민과의 소중한 약속인 민선7기 공약이행 100% 목표 달성에 최선을 다 하겠음.

Ⅳ 향후계획

- 군 홈페이지 매니페스토 관리카드 점검 : 2021. 1월

V 참고사항

1 세부사업별 추진율 현황(7대분야 58개 사업)

| 관리번호 | 공약명 | 추진율 (%) | 투자실적 (백만원) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 민선7기 공약사항 추진상황 종합진도율 | | 76.9% (완료 27) | 270,218 |
| <군민 모두가 행복한 복지영양 건설> | | 73% (완료 7) | 23,320 |
| 1-1 | 경로당 점진적 부식비 지원 | 100% | 1,168 |
| 1-2 | 이·미용권 및 목욕권 확대 지급 | 85% | 6,606 |
| 1-3 | 장애인 주간보호센터 건립 | 30% | 970 |
| 1-4 | 노인 주야간보호센터 건립 | 30% | 970 |
| 1-5 | 노인종합복지회관 증개축 | 70% | 2,361 |
| 1-6 | 경로당 운영비 절감을 위한 태양광 설치 지원 | 75% | 215 |
| 1-7 | 천원버스 중·고등학생 요금인하 | 100% | 80 |
| 1-8 | 학산면 소규모 도서관 신축 | 20% | 1,990 |
| 1-9 | 삼호도서관 증축 및 리모델링 | 100% | 2,308 |
| 1-10 | 삼호 어울림 문화체육센터 건립 (어린이 종합문화센터 건립) | 20% | - |
| 1-11 | 어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원 | 100% | 156 |
| 1-12 | 치매안심센터 및 재활치료센터 신축 | 100% | 3,010 |
| 1-13 | 농어촌 의료서비스 개선 | 100% | 1,189 |
| 1-14 | 중·고등학교 신입생 무상교복 지급 | 100% | 484 |
| 1-15 | 방범용 CCTV 설치 확대 | 78% | 1,813 |
| <일자리 창출과 생동하는 지역경제 활성화> | | 60% (완료 1) | 12,301 |
| 2-1 | 자동차 튜닝 기술자 양성 | 100% | 1,285 |
| 2-2 | 친환경에너지(태양광) 마을만들기 | 70% | 3,670 |

| 관리번호 | 공약명 | 추진율 (%) | 투자실적 (백만원) |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 2-3 | 맞춤형 전통시장 육성 | 40% | 3,566 |
| 2-4 | 삼호실내수영장 건립 | 30% | 3,780 |
| <생명산업과 최첨단 농업선도> | | 86% (완료 7) | 44,728 |
| 3-1 | 국립종자원 벼 정선시설 건립으로 고품질 쌀 생산 | 85% | 25,893 |
| 3-2 | 국립종자원 채종포 단지 확대 | 70% | - |
| 3-3 | 읍·면별 특화작목 육성을 통해 농가소득증대 | 65% | 1,200 |
| 3-4 | 스마트팜 활성화를 통한 최첨단 농업육성 | 70% | 1,451 |
| 3-5 | 벼 건조·저장시설(DSC) 확충 | 100% | 1,000 |
| 3-6 | 고품질 특화전략 및 달마지쌀골드 명품화 | 70% | 7,530 |
| 3-7 | 들녘경영체 육성(다각화) | 100% | 1,000 |
| 3-8 | 전통식품 산업화 지원 | 100% | 744 |
| 3-9 | 우수농·특산물 6차산업화 추진 | 80% | 1,420 |
| 3-10 | 아시아종묘원과 함께 기후와 토양에 맞는 품종선발 | 60% | 100 |
| 3-11 | 잔류농약 분석실 설치 | 100% | 2,756 |
| 3-12 | 농기계임대사업소 북부분점 신축 | 100% | 1,265 |
| 3-13 | 축산과 신설 | 100% | - |
| 3-14 | 친환경미생물 배양시설 설치 운영 | 100% | 369 |
| <자동차튜닝·항공·드론산업 활성화> | | 70% (완료 2) | 141,940 |
| 4-1 | 자동차튜닝산업 클러스터 구축 | 40% | 141,000 |
| 4-2 | 항공(경비행기)·드론산업 육성 | 40% | 35 |
| 4-3 | 제5회 항공레저스포츠제전 개최 | 100% | 365 |
| 4-4 | 드론을 활용한 농업생산비 및 농촌일손 부담 경감 | 100% | 540 |

| 관리번호 | 공약명 | 추진율 (%) | 투자실적 (백만원) |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|
| <역사문화관광·스포츠산업 집중 육성> | | 53% (완료 1) | 9,090 |
| 5-1 | 트로트 창작센터 건립 | 5% | 20 |
| 5-2 | 하정웅 미술관 창작교육관 건립 | 100% | 4,400 |
| 5-3 | 도갑지구 문화공원 조성 | 80% | 1,380 |
| 5-4 | 월출산 명사탐방로(風水길) 조성 | 60% | 944 |
| 5-5 | 영암 인조잔디 족구장 및 야구장 설치(리모델링) | 90% | 2,000 |
| 5-6 | 삼호 어울림 문화체육센터 건립 (영암군 민속씨름 종합체육센터 건립) | 5% | - |
| 5-7 | 영암읍성 오색스카이웨이 조성 (영암 달맞이공원 조성사업) | 30% | 346 |
| <깨끗하고 쾌적한 일등영암 만들기> | | 87% (완료 5) | 14,459 |
| 6-1 | 도로 재비산먼지 제거차량 구입 청정영암 구현 | 100% | 243 |
| 6-2 | 가축분뇨 공공처리시설 개선 | 100% | 1,007 |
| 6-3 | 깨끗하고 쾌적한 영암만들기 운동 전개 | 75% | 2,805 |
| 6-4 | 사계절 아름다운 꽃길조성 관리 | 60% | 981 |
| 6-5 | 깨끗하고 쾌적한 가로녹지대 조성 관리 | 60% | 2,757 |
| 6-6 | 미암 명품숲 조성 | 100% | 260 |
| 6-7 | 미암 서울농장 조성 | 100% | 3,400 |
| 6-8 | 영암군 기록관 건립 | 100% | 3,006 |
| <조화롭고 활기 넘치는 지역균형발전> | | 96% (완료 4) | 24,381 |
| 7-1 | 마한문화공원 조성(내동리 쌍무덤 발굴) | 90% | 500 |
| 7-2 | 무화과 산업특구 전략 추진 | 85% | 8,901 |
| 7-3 | 농산물종합가공지원센터 건립 | 100% | 2,970 |
| 7-4 | 신북면 농촌중심지 활성화사업 추진 | 100% | 5,221 |
| 7-5 | 도포권역 종합정비사업 추진 | 100% | 4,500 |
| 7-6 | 금정지구 농어촌 지방상수도 개발 | 100% | 2,289 |

② 분야별 추진상황

(1) 군민 모두가 행복한 복지영양 건설(추진율 73%)

추진현황

- 사업현황 : 15개 사업(완료 7, 추진중 8)
- 투자현황 : 23,320백만원(국비 5,243, 도비 633, 군비 17,235, 기타 209)

1-1. 경로당 점진적 부식비 지원(이행 후 계속추진)

- 경로당 부식비 지원을 위한 경로당 현황조사 : '18. 8. 13.
 - 경로당 회원수, 급식 실시 여부, 부식비 지원 희망 여부
- 「영암군 경로당 지원에 관한 조례」 개정 : '18. 12. 13.
- 경로당 가사 도우미(노인일자리) 배치 : '19. 2. 18.
- 경로당 부식비 지원 사업비(409백만원) 1회 추경 확보 : '19. 4. 1.
- 경로당 대표자 및 이용자 위생교육 실시 : '19. 6. 11.
- 경로당 식중독 예방 일제점검 : '19. 8. 9.
- 경로당 부식비 지원 : '19. 7. ~ 12.
 - 4개월(7~8월, 11~12월) / 415개소 / 391백만원
 - 지원액 : 회원 수 30인 이하 월 20만원, 30인 초과 월 30만원
- 경로당 부식비 점진적 확대 방안 마련 : '19. 10. 18.
 - 7개월 / 442개소 / 1,840백만원
 - 지원액 : 최대 100만원, 최소 20만원(경로당 회원 수에 따라 차등 지급)
- '20년 경로당 부식비 지원계획 수립 : '20. 1.
 - 연중 / 442개소 / 1,500백만원
 - 지원액 : 최대 75만원, 최소 20만원(경로당 회원 수에 따라 차등 지급)
- '20년 경로당 부식비 지급(1분기) : '20. 1.
 - 428개소 / 425백만원

1-2. 이·미용권 및 목욕권 확대 지급(추진중)

- 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원 조례 개정('18.12.13.) 및 시행('19. 1. 1.)
 - 어르신 이용권 지급매수 확대 (28매→34매)
- 어르신 이용권 사용 만족도 설문조사 : '18. 10.
 - 만족 응답 : 94%, 불만족 응답 : 6%
- 1~4분기 어르신 이용권 배부 : '19. 1. ~ 9.
- 2019년 어르신 이용권 모니터링단 운영 : '19. 11. 21. ~ 12. 3.
- 영암군 노인 목욕비 및 이·미용비 지원 조례 개정 : '19. 12.
 - 5,000원권 기준으로 예산 범위내에서 지급
- 어르신 이용권 만족도 조사 : '19. 12.
- 2020년 1분기 어르신 이용권 배부(1인당 10매) : '19. 12.
- 2020년 어르신 이용권 모니터링단 운영 : '20. 3. ~ 5.
- 2020년 2분기 어르신 이용권 배부(1인당 7매) : '20. 4.
- 2020년 어르신 이용권 모니터링단 운영 : '20. 8. ~ 12.
- 2020년 3분기 어르신 이용권 배부(1인당 10매) : '20. 9.
- 어르신 이용권 사용 만족도 설문조사 : '20. 11.
- 2020년 1분기 어르신 이용권 배부(1인당 10매) : '19. 12.
- 2020년 어르신 이용권 모니터링단 운영 : '20. 3. ~ 5.
- 2020년 2분기 어르신 이용권 배부(1인당 7매) : '20. 4.

1-3. 장애인 주간보호센터 건립(추진중)

- 국토교통부, 2019년 고령자 복지주택 공모사업 신청(도시개발과) : '19. 3. 29.
- 대상지 현장 평가(국토부 및 LH본사) : '19. 4. 5.
- 2019년 고령자 복지주택 공모사업 선정 : '19. 4. 29.
- 고령자 복지주택사업 업무협약(LH 공사) : '19. 9. 10.
- 장애인주간보호시설 설치 및 운영 조례 개정 : '19. 10. 10.

- 주택건설 사업계획 승인(국토교통부) : '19. 12.
- 사업부지 토지매입, 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행(도시개발과) : '19. 9. ~ '20. 12.
- 고령자 복지주택 건축공사 착수(LH) : '20. 12. ~

1-4. 노인 주야간보호센터 건립(추진중)

- 국토교통부, 2019년 고령자 복지주택 공모사업 신청(도시개발과) : '19. 3. 29.
- 대상지 현장 평가(국토부 및 LH본사) : '19. 4. 5.
- 2019년 고령자 복지주택 공모사업 선정 : '19. 4. 29.
- 고령자 복지주택사업 업무협약(LH 공사) : '19. 9. 10.
- 주택건설 사업계획 승인(국토교통부) : '19. 12.
- 사업부지 토지매입, 기본 및 실시설계 등 행정절차 이행(도시개발과) : '19. 9. ~ '20. 12.
- 고령자 복지주택 건축공사 착수(LH) : '20. 12. ~

1-5. 노인종합복지회관 증개축(추진중)

- 세부 추진계획 수립 : '18. 10. 22.
- 군 지방재정 투자심사 : '19. 4. 19.
- 군 공유재산 심의 : '19. 6. 28.
- 노인종합복지회관 증개축 공사 예산 확보 : '19. 7. 1.
 - 사업비 1,550백만원, 2019. 2회 추경시 확보
- 실시설계 용역 : '19. 7. ~ '20. 1.
- 노인종합복지회관 증개축 공사 소요예산 확보 : '20. 1.
 - 사업비 500백만원, 2020년 본예산 확보
- 노인종합복지회관 증개축 공사 추가 예산 확보 : '20. 4.
 - 승강기 설치, 화장실 증축 / 200백만원, 2020. 1회 추경 확보
- 도 계약심사 의뢰 완료 : '20. 5.

- (사)대한노인회 영암군지회 임시 사무실 이전 : '20. 5.
 - 장소 : 영암국민체육센터 내 (구)체육회 사무실
- 계약의뢰(재무과) : '20. 5.
- 공사 착공 및 공사추진 : '20. 6. ~

1-6. 경로당 운영비 절감을 위한 태양광 설치 지원(추진중)

- 2019년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업
 - 희망지 전기요금 조사 : '18. 8. 14. ~ 8. 27.
 - 사업 신청(전남도) : '18. 8. 31.
 - 대상지 선정(1개소, 도비보조사업) : '19. 1. 7.
 - 추가 희망지 전기요금 조사 : '19. 3. 27. ~ 4. 5.
 - 사업 신청(전남도) : '19. 4. 5.
 - 대상지 추가 선정(10개소, 도비보조사업) : '19. 5. 1.
 - 경로당 태양광 발전시설 설치완료(11개소) : '19. 11. 27.
- 2020년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 희망지 전기요금 조사 : '19. 8.
 - 9개소 / 67,500천원(도비보조사업)
- 2020년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 대상지 추가 선정 : '20. 4.
 - 15개소 / 117,000천원(도비보조사업)
- 2021년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 희망지 전기요금 조사 : '20. 10.
 - 8개소 / 60,000천원(도비보조사업)
- 2020년도 경로당 태양광 발전시설 설치사업 완료
 - 15개소 / 117,000천원(도비보조사업) : '20. 12.

1-7. 천원버스 중·고등학생 요금인하(이행 후 계속추진)

- 천원버스 중·고등학생 이용요금 산정 : '19. 2.
- 예산 70백만원 확보(제1회 추경) : '19. 3.
- 운수회사 중·고등학생 요금인하 협약 체결 : '19. 5.
- 운수회사 인가신고 및 수리 : '19. 5.

- 천원버스 중·고등학생 요금인하 시행 : '19. 6.
- 2019 농어촌버스 손실보상금 산정용역 실시 : '19. 6. ~ 10.
- 2020 농어촌버스 손실보상금 산정용역 실시 : '20. 7. ~ 12.

1-8. 학산면 소규모 도서관 신축(추진중)

- 학산면 소규모 신축 기본계획 수립 완료 : '17. 7.
- 행정절차 이행(공유재산, 투자심사, 성별영향 평가) : '17. 9. ~ 12.
- 문체부 공공도서관 건립 현장실사 완료 : '18. 3.
- 사업계획 변경(부지, 사업기간, 사업비) : '20. 1.
- 행정절차 이행 : '20. 3. ~ 5.
 - 공유재산 관리계획 변경, 투자심사 변경 심의, 공공건축 심의
- 감정평가 및 토지매입 완료 : '20. 4. ~ 5.
- 사업계획 변경 승인(문체부) : '20. 8.
- 변경 기본 및 실시설계 완료 : '20. 11.
- 공공디자인진흥위원회 심의 의결 : '20. 11.

1-9. 삼호도서관 증축 및 리모델링(추진완료)

- 道 공공디자인 심의 완료 : '18. 9. 17.
- 道 계약심사 완료 : '18. 11. 29.
- 실시설계 완료 : '18. 12.
- 삼호도서관 증축 및 리모델링 시행 계획 수립 : '18. 12. 21.
- 삼호도서관 증축 및 리모델링 공사 건축·전기·소방·통신 등 계약: '19. 2. 22.
- 공사 착공 : '19. 3. 7.
- 증축관 준공 : '19. 9. 30.
- 본관 리모델링 준공 : '19. 11. 15.
- 삼호도서관 재개관 : '19. 11. 28.
- 삼호도서관 재개관 기념 프로그램 운영 : '19. 12.

1-10. 삼호 어울림 문화체육센터(어린이 종합문화센터) 건립(추진중)

- 2019년 고용·산업위기지역 관련 국고 지원 신청 : '19. 2.
- 2020년 생활형SOC복합화사업(문화체육관광부) 신청 : '19. 4.
- 2021년 지방체육시설지원 균형발전특별회계(문화체육관광부)신청 : '20. 4.
- 사업부지 건물(삼호읍 서부출장소, 지역아동센터, 자율방범대) 이전 : '20. 12.

1-11. 어린이집·지역아동센터 공기청정기 지원(추진완료)

- 어린이집 공기청정기 지원을 위한 수요조사 : '18.
- 어린이집 공기청정기 지원 완료 : '18.
 - 39개소, 192대, 111백만원(국비 54, 도비 9, 군비 23, 자담 25)
- 지역아동센터 공기청정기 보급(38대) 완료 : '19.
- 지역아동센터 공기청정기 추가지원 임대료 : '19. ~ '20.
 - 19개소, 34대, 18백만원(국비 9, 도비 3, 군비 6)

1-12. 치매안심센터 및 재활치료센터 신축(추진완료)

- 치매안심센터 및 농어촌의료서비스개선사업 지원 확정(보건복지부) : '17. 10.
- 영암군 공유재산관리계획 반영 : '17. 10.
- 영암군 지방재정 투자심사 의결 : '17. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '18. 6.
- 센터 신축공사 착공 : '18. 7.
- 공사 준공 : '19. 3.
- 영암군 재활 및 치매안심센터 개소 : '19. 4.

1-13. 농어촌 의료서비스 개선(추진완료)

- 보건기관 시설 개·보수
 - 기본 및 실시설계 완료 : '19. 5.
 - 보건복지부 설계 심의완료 : '19. 6.
 - 개·보수 공사 착공 : '19. 9.
 - 개·보수 공사 사업완료 : '19. 12.

○ 의료장비 인프라 구축완료

- 구축대상 : 보건소(10종, 15대), 보건지소(4종, 4대), 보건진료소(6종, 22대)
- 사업내용 : 18종 41대(디지털방사선 촬영장치 등)
- 의료장비 구축 완료 : '19. 11.

1-14. 중·고등학교 신입생 무상교복 지급(이행 후 계속추진)

○ 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부) : '18. 8.

○ 기초자료조사 (중복지원 제도 등) : '18. 8.

○ 중학교 신입생 교복비 지원 동의안 제출(군→전라남도교육청) : '18. 9.

- 도 교육감 공약사업에 따른 중학생 교복비 50% 도교육청 지원

○ 신입생 교복비 지원을 위한 추진계획 수립 및 홍보 : '19. 2.

○ 신입생 무상교복비 지원 신청 접수 및 지원 대상자 확정 : '19. 3.

○ 중·고등학교 신입생 교복비 지원 : '19. 3.

- 중 학생 : 377명, 116백만원(군비 58, 도교육청 58)

- 고등학생 : 349명, 99백만원(군비)

○ 2020년도 고등학교 신입생 교복비 지원계획 제출(군→전라남도교육청) : '19. 8.

※ 2020년도부터 도교육청 지원범위(50%) 고등학교까지 확대

○ 2020년도 중·고등학교 신입생 무상교복 지급 홍보 : '19. 12.

○ 2020년도 신입생 무상교복비 지원 신청 접수 및 대상자 확정 : '20. 3.

○ 2020년도 중학교 신입생 교복비 지원 : '20. 5.

- 중 학생 : 439명, 132백만원(군비 66, 도교육청 66)

○ 2020년도 고등학교 신입생 교복비 지원 : '20. 7.

- 고등학생 : 304명, 92백만원(군비 46, 도교육청 46)

○ 영암군 교복 지원 조례 일부개정 : '20. 10.

○ 2020년도 고등학교 신입생 교복비 추가 지원 : '20. 11.

- 고등학생 : 95명, 28백만원(군비 14, 도교육청 14)

1-15. 방법용 CCTV 설치 확대(추진중)

- 마을방법 CCTV 설치 : 96개소 / 844백만원
- 다목적방법 CCTV 설치 : 4개소 / 100백만원
- 차량번호인식 CCTV 설치 : 10개소 / 300백만원

[2] 일자리 창출과 생동하는 지역경제 활성화(추진율 60%)

추진 현황

- 사업현황 : 4개 사업(완료 1, 추진중 3)
- 투자현황 : 12,301백만원(국비 6,197, 도비 607, 군비 4,687, 기타 810)

2-1. 자동차튜닝 기술자 양성(추진완료)

- 자동차 튜닝 부품 설계 및 제조 전문 인력양성
 - 9명 교육 완료(관련기업 9명 취업)
- 자율주행 전기 자동차 및 부품 엔지니어 양성
 - 12명 교육 완료
- 고용위기 지역 중소기업 맞춤형 지원 신규일자리 창출
 - 자동차관련 2개 신규기업유치, 3개 조선기업의 자동차 업종전환 지원, 47명 신규고용(자동차 35명, 조선업 12명)

2-2. 친환경에너지(태양광) 마을만들기(추진중)

- 친환경에너지 주택지원사업
 - '18년 주택지원사업 지원 : 40가구(240백만원)
 - '19년 주택지원사업 지원 : 43가구(300백만원)
 - '20년 주택지원사업 신청 : 28가구(140백만원)
- 신재생에너지 융·복합지원사업
 - '20년 신재생에너지 융·복합지원사업 공모사업 선정('19. 9.)
 - '20년 신재생에너지 융·복합지원사업 사업 추진(삼호읍) : 338가구
 - '21년 신재생에너지 융·복합지원사업 선정('20. 12. 04) : 450가구

2-3. 맞춤형 전통시장 육성(추진중)

- 전통시장 매니저(전문인력) 상시 운영(2명) : '19. 01. ~ 10.
- 신북5일시장 어닝설치공사 완료(6백만원) : '19. 05.
- 독천5일시장 시설현대화사업 완료(3,210백만원) : '19. 09.
- 전통시장 품물공연 행사 추진(월 2회 / 영암, 독천) : '19. 10. ~ 12.
- 영암5일시장 비가림시설 설치공사 완료(303백만원) : '19. 12.
- 독천5일시장 비가림시설 설치공사 완료(119백만원) : '20. 04.
- 전통시장 나르미(美) 운영 지원사업 추진(26명) : '20. 01. ~

2-4. 삼호실내수영장 건립(추진중)

- 기본계획 및 타당성조사용역 : '18. 1. ~ 6.
- 지방재정투자심사 완료 : '18. 10.
- 2019년 지방체육진흥시설 지원사업 선정 : '18. 10.
- 공유재산관리계획 반영 : '18. 12.
- 설계공모 작품심사 완료 및 설계업체 확정 : '19. 4. ~ 6.
- 실시설계용역 시행 : '19. 7. ~ '20. 4.
- 군관리계획(변경)결정 및 실시계획인가 용역 시행 : '20. 9. ~ 11.
- 전라남도 건설기술심의 : '20. 10. ~ 11.
- 계약심의 완료 : '20. 11.

[3] 생명산업과 최첨단 농업선도(추진율 83%)

추진현황

- 사업현황 : 14개 사업(완료 7, 추진중 7)
- 투자현황 : 44,728백만원(국비 30,119, 도비 1,547, 군비 7,711, 기타 5,351)

3-1. 국립종자원 벼 정선시설 건립으로 고품질 쌀 생산(추진중)

- 벼 정선시설 완공(2019. 8.)
 - 248억원(전액국비), 정선센터 (5,124㎡), 청사동(1,049㎡), 기타(829㎡)
- 벼 보급종 및 농협 권장품종 공급차액 지원
 - 542백만원 ('18년 141, '19년 180, '20년 221)
- 유기농 쌀 재배면적 확대
 - '18년(1,652ha) ⇨ '19년(2,039ha) ⇨ '20년(2,242ha)

3-2. 국립종자원 채종포 단지 확대(추진중)

- 식량작물(벼·보리) 보급종 생산 계약 재배 추진
 - '18년 : (6개소, 165ha) / 벼 120ha(도포1, 군서2, 서호1)/보리 45ha(영암2)
 - '19년 : (8개소, 225ha) / 벼 180ha(도포1, 군서3, 서호2)/보리 45ha(영암2)
 - '20년 : (8개소, 225ha) / 벼 180ha(도포1, 군서3, 서호2)/보리 45ha(영암2)
- '21년산 벼 보급종 채종포 예비단지 선정(국립종자원) : 1개소, 30ha

3-3. 읍·면별 특화작목 육성을 통해 농가소득증대(추진중)

- '18년 : 3개소, 5개 품목, 400백만원 사업완료
 - 사업대상자: 신북농협, 도포농협, 블루베리작목반
 - 품목 : 풋고추, 블루베리, 멜론, 애플수박, 절임배추
- '19년 : 4개소, 6개 품목, 600백만원 사업완료
 - 사업대상자 : 신북농협, 도포농협, 기찬포도 영농조합, 월출산 왕인버섯
 - 품목 : 샤인머스켓, 메론, 애플수박, 버섯, 풋고추, 단감
 - 2019년 왕인문화축제 육성품목 전시판매
- '20년 : 5개소, 4개 품목, 176백만원 사업추진중
 - 사업대상자 : 신북농협, 영암남주농협, 도포참영농조합법인, 도포원에정보화마을, 월출산왕인버섯
 - 품목 : 풋고추, 단감, 목이버섯, 멜론

3-4. 스마트팜 활성화를 통한 최첨단 농업육성(추진중)

- '18년 : 3농가(1.1ha), 복합환경관리/128백만원
- '19년 : 8농가(4.5ha), 복합환경관리(기반구축)/907백만원
- '20년 : 3농가(2.2ha), 복합환경관리(기반구축)/346백만원 : '20. 3.

3-5. 벼 건조·저장시설(DSC) 확충(추진완료)

- 서영암농협 벼 건조·저장시설 준공 : '18. 10.
 - 600백만원 (국비 100, 도비 30, 군비 70, 자담 400)
- 서영암농협 벼 건조·저장시설 정산 : '19. 2.
 - 400백만원 (국비 400)

3-6. 고품질 특화전략 및 달마지쌀골드 명품화(추진중)

- 달마지쌀, 유기농벼 생산 장려금 지원 : 1,143백만원
 - '18년(67,705가마(40kg), 168백만원), '19년(75,000가마, 300백만원), '20년(110,405가마, 675백만원)
- 서영암농협 저온창고(990㎡) 완공 : '19. 10.
- 2020년 농림사업(고품질쌀유통활성화사업) 완공 : '20. 12.
 - 영암군농협통합RPC, 1,100백만원, 사일로500톤×5기, 건조기 30톤×3기, 집진시설 1식

3-7. 틈틈경영체 육성(다각화)(추진완료)

- 농식품부 세부사업 계획서 최종승인 : '18. 07.
- 메밀가공시설 입찰 및 시공업체 선정 : '18. 12.
- 메밀가공시설 설치 사업(공사) 준공 : '19. 12.

3-8. 전통식품 산업화 지원(추진완료)

- '17년 : 강소 농식품기업 경쟁력강화 : 산골정(전통장류)
 - 사업내용 : 전통장류 가공공장 신축(72㎡) 및 전기공사 등
 - 사업비 : 100백만원(균특 50, 군비 10, 자담 40)
 - 추진상황 : 2019. 12. 완료

- '18년 : 전통식품 산업화 : (주)왕인식품(김치)
 - 사업내용 : 김치저장시설증축(100㎡), 가공기계장비 구입(10종) 등
 - 사업비 : 500백만원(균특 250, 군비 50, 자담 200)
 - 추진상황 : 2019. 12. 완료
- '20년 : 강소 농식품기업 경쟁력강화
 - 사업내용 : 발효식품 가공장비 구입
 - 사업비 : 80백만원(균특이양 40, 군비 8, 자담 32)
 - 추진상황 : 공모사업 대상자 확정(정그린/전통발효식품)
- '20년 : 전통식품산업 인프라 구축
 - 사업내용 : 전통식품 가공 장비·시설 구축
 - 사업비 : 64백만원(군비 32, 자담 32)
 - 추진상황 : 금정전통장류(전통장류), 서호월평영농조합법인(한과) 사업완료

3-9. 우수 농 · 특산물 6차산업화 추진(추진중)

- 농촌융복합 공모사업 : 4개소/ 1,100백만원(보조 420, 융자 및 자담 680)
 - 삼호 열매농원(무화과) 체험시설 신축 완료 : '19년(500백만원)
 - 덕진 김스팜(대봉감) 농막설치, 조경수 식재 등 완료 : '19년(100백만원)
 - 영암 누리농장(감) 체험시설을 위한 융자사업 추진 중 : '20년(400백만원)
 - 서호 지원목장(유제품) 가공공장 증축, 장비구입 추진 중 : '20년(100백만원)
- 무화과 지역단위 네트워크 구축사업 사업완료
 - 상호농협 (5개 법인참여)/300백만원('18 ~ '19, 2개년 추진)
 - 사업내용 : 무화과 6차산업을 위한 역량강화, 상품개발, 홍보 및 마케팅
- 무화과 농촌융복합산업 컨설팅 연구용역 추진 완료(군비 20백만원)

3-10. 아시아중요원과 함께 기후와 토양에 맞는 품종선발(추진중)

- 관계자 사전 업무협의(3회) : '18. 7. ~ '19. 1.
- 작목별 사전 자료수집 : '18. 8. ~ 9.

- 농업관련 관계자회의 개최 : '19. 1.
 - 친환경농업과, 축산과, 농업기술센터, 아시아종묘 관계자 등
- 품종선발 현장조사 : '19. 1. ~ 3.
- 옥수수(0.3ha), 비트(0.1ha, 2품종), 무화과 실증시험 : '19. 3. ~ 12.
- 지역적응 및 신소득작목 연계 실증시험(7작목) : '20. 2. ~ 10.
- 실증작목 시식회 등 홍보추진 : '20. 7. ~ 9.
 - 오색옥수수 : 신문보도 26건, 미인풋고추 : 신문보도13건

3-11. 잔류농약 분석실 설치(추진완료)

- 잔류농약분석실 신축
 - 설계용역 및 계약심사 완료 : '18. 9. 19.
 - 공사시공 낙찰자 선정 및 계약체결 : '18. 11. 9.
 - 신축공사 건축 착공 : '18. 11. 15.
 - 신축공사 건축 준공 : '19. 5. 31.
 - 준공검사 완료 : '19. 6. 10.
- 잔류농약분석실 분석시스템 기반조성
 - 분석실 주분석장비(LC-MS/MS, GC-MS/MS) 외자구입요청 : '19. 3.
 - 분석실 분석장비(전처리장비, 실험기자재) 입찰의뢰 : '19. 6.
 - 분석실 분석기반(실험대, 후드 등) 조달 3자단가 구입요청 : '19. 6.
 - 분석시스템 기반조성 : '19. 8.~9.
 - 잔류농약분석실 시범운영 및 매뉴얼 제작 : '19. 10.~12.
- 농업환경분석실 준공식 개최 : '19. 11. 26.
- 농업환경분석실 운영관련 조례 제정 : '20. 4. 2.
- 농업환경분석실 전문인력 채용 : '20. 9. 14.
- 농업환경분석실 개소 : '20. 9. 21.

3-12. 농기계임대사업소 북부분점 신축(추진완료)

- 신축공사 설계 계약심사 및 개발행위 허가 협의 : '18. 8. 13.
- 신축공사 착공 : '18. 10. 4.
- 신축공사 준공 : '18. 12. 28.
- 임대농기계 및 관리장비 운반 배치 : '19. 1. ~ 2.
- 농기계임대북부사업소 개소식 및 운영 : '19. 2. 28.
- 농기계임대북부사업소 운영실적

| 구분 | 임대대수 | 수혜농가수 | 임대료(천원) |
|-------|-------|-------|---------|
| 2019년 | 1,602 | 1,321 | 28,191 |
| 2020년 | 2,030 | 1,430 | 53,137 |

3-13. 축산과 신설(추진완료)

- 축산업무 사무량 진단 및 조직진단 : '18. 7. ~ 8.
- 관내 11개 축산단체 의견수렴 : '18. 9. ~ 10.
- 축산과 신설안 최종 확정 : '19. 10.
- 영암군 행정기구 설치 조례 및 시행규칙 개정 : '19. 11. ~ 12.
- 축산과(4개팀) 신설 : '19. 1.

3-14. 친환경미생물 배양시설 설치 운영(추진완료)

- 2019 미생물배양시설설치 예산확보(군비150백만원) : '18. 10. 4.
- 미생물 배양장비 설비계획 검토협의 : '19. 4. ~
- 미생물 배양기 증설계획 수립 : '19. 9.
- 장비구입 입찰 및 제작 착수 : '19. 10.
- 멸균배양시설 설치 완료 : '20. 2.
- 유용미생물 확대공급(~5.14) : 목표치 40%달성

| 구분 | 합계(ℓ) | 고초균(ℓ) | 유산균(ℓ) | 효모(ℓ) | 광합성(ℓ) |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 합계 | 44,485 | 12,795 | 11,785 | 11,290 | 8,615 |

[4] 자동차튜닝산업과 항공·드론산업 활성화(추진율 70%)

추진 현황

- 사업현황 : 4개 사업(완료 2, 추진중 2)
- 투자현황 : 141,940백만원(국비 74,130, 도비 52,633, 군비 376, 기타 14,801)

4-1. 자동차 튜닝산업 클러스터 구축(추진중)

- 차부품 고급브랜드화 연구개발 사업('13 ~ '18년, 513억원)
 - 평가장비동('15.8.)연구지원동('16.7.) 준공
 - 기술개발 5과제(완료), 장비구축 8종(완료), 평가법 개발 3종(완료)
- 튜닝산업 지원시스템 구축사업('14 ~ '19년, 418억원)
 - 튜닝부품 시험평가동('17.10.) 및 기업지원동('18.4.) 준공
 - 장비구축 19종(완료), 평가법 개발 8종(완료)
- 튜닝부품 선도기업 맞춤형지원 사업('17 ~ '20년, 200억원)
 - 기술개발 12과제(완료 6), 장비구축 13종(완료), 사원화지원 20개사
- 소량생산 자동차 인증 시행규칙 개정건의('19. 06.)
- 미래형 자동차 부품개발사업('19 ~ '21년, 335억원)
 - 기술개발 8과제(진행), 전기차 연구동 건립(착공예정), 기반구축 4분야(예정), 사업화지원 40개사(진행)
- 한국자동차연구원 주관 국비지원 공모사업 추진 중('19 ~ '21년)
 - 소량생산 인증평가법 개발하여 소량생산 완성차에 적용
- 자동차 부품산업 제품 고도화 지원('20년, 2.5억원)

4-2. 항공(경비행기)·드론산업 육성(소형항공기 클러스터 구축)(추진중)

- 경운대 이착륙장(800M) 완공 : '18. 10.
- 경운대 조종사 전문기관 지정(국토교통부) : '18. 11.
- 경운대 Flying Center 개소(3층 2개동, 73실) : '19. 05.
 - 20. 3월 기준 학생·교관 83명 입실

- 안내표지판 설치 완료(경운대 4개, 군 3개) : '19. 12.
- 경운대 이착륙장 주변마을 등 건의사업 완료(17건) : '19. 12.
- 소형항공기 클러스터 구축 연구용역 : '19. 10.
- 에어콧 드론 전문 교육원 총 785명 교육 완료 : '19. 12.
- 제6차(21~25) 공항개발 종합계획 의견서 제출 : '20. 2.
- (국토부·도·군) 영암 훈련용 항공기 비행장 개발 회의 : '20. 6.
- 영암 훈련용 항공기 비행장 개발 용역비 국토부, 국회 건의 : '20. 10.
- 경운대 Flying Center 내 왕복엔진교육센터 개설 : '20. 11.

4-3. 제5회 항공레저스포츠제전 개최(추진완료)

- 세부일정 확정 전부터 항공제전 개요 홍보 시작('18. 3. 26.)
 - 제5회 항공레저스포츠제전 홍보물(전단) 제작 홍보
 - 기찬랜드 방문객 대상 홍보(7~8월 토,일요일/ 물티슈, 홍보전단)
- 세부일정 확정 후 항공제전 본격 홍보시작('18. 9. 12.)
- 항공제전 추진계획 설명회 개최('18. 10. 4.)
- 행사장 및 주차장 조성 및 정비, 환경정화활동('18. 10. 5.~10. 30.)
- 종이비행기대회 사전 홍보차 ‘찾아가는 종이비행기 교실’ 운영
(‘18. 10. 15.~19. / 도내 8개 학교 9개 교실 운영)
- 제5회 항공레저스포츠제전 성공개최('18. 11. 3.~4.) / 5만여명 방문

4-4. 드론을 활용한 농업생산비 및 농촌일손 부담 경감(이행 후 계속추진)

- 2018 드론 활용 노동력 절감 벼 재배단지 육성시범 : 2개소(영암, 신북)
 - 30ha, 100백만원(국비 50, 군비 50)
- 2019 드론 활용 벼 항공 직파 재배단지 조성 시범 : 2개소(시종, 서호)
 - 30ha, 80백만원(도비 24, 군비 32, 자부담 24)
- 2019 농산물 생산비 절감 지원사업(친환경농업과) : 1개소(시종)
 - 농업용 드론 1대, 25백만원(도비 3.75, 군비 8.75, 자부담 12.5)

- 2019 농업용드론 지원사업(친환경농업과) : 1개소(서호)
 - 농업용 드론 3대, 75백만원(군비 22.5, 자부담 52.5)
- 2020 드론활용 노동력 절감 벼 재배단지 육성시범 : 1개소(금정)
 - 15ha, 40백만원(군비 28, 자부담 12)
- 2020 농산물 생산비절감 지원사업(친환경농업과) : 7개소
 - 농업용 드론 7대(영암 1, 삼호 1, 시종 2, 도포 1, 군서 1, 서호 1)
 - 175백만원(도비 26.25, 군비 61.25, 자부담 87.5)
- 2020 농업용 드론지원사업(친환경농업과) : 2개소(덕진, 학산)
 - 농업용 드론 2대, 45백만원(군비 22.5, 자부담 22.5)

[5] 역사문화관광 · 스포츠산업 집중 육성[추진율 53%]

추진 현황

- 사업현황 : 7개 사업(완료 1, 추진중 6)
- 투자현황 : 9,090백만원(국비 3,072, 도비 385, 군비 5,633, 기타-)

5-1. 트로트 창작센터 건립(추진중)

- 기본 및 타당성 조사 용역 : '18. 9

5-2. 하정웅 미술관 창작교육관 건립(추진완료)

- 기본 및 실시설계용역 추진계획 수립 : '18. 10.
- 2018년 군비(750백만원) 확보 : '18. 8.
- 기본 및 실시설계용역 일상감사 완료(결과: 적정) : '18. 10.
- 기본 및 실시설계용역 계약의뢰(군⇒조달청) : '18. 10.
- 2018년 국고보조금(500백만원) 교부결정 및 송금 통보(문체부⇒군) : '18. 11.
- 기본 및 실시설계용역 계약체결 및 착수 : '18. 12.
 - (주)연우건축사사무소 김강수 / 156,500천원 / 착수일로부터 180일간

- 국내 미술관 사례조사 : '19. 1.
 - 2019. 1. 23. ~ 1. 24.(2일간) / 양주시립 장육진 미술관 외 3개소
- 일본 미술관 사례조사 및 하정웅선생 자문회의 : '19. 2.
 - 2019. 2. 13. ~ 2. 15.(3일간) / 도쿄 네즈미술관 외 4개소
- 창작교육관 기본계획 확정 : '19. 4.
 - 하정웅선생 및 향후 운영팀 의견수렴을 통해 기본계획 확정, 실시설계 착수
- 2019년 국고보조금(900백만원) 교부 및 송금(문체부⇒군) : '19. 5. 7.
- 영암군 경관 및 공공디자인 심의(결과: 원안의결) : '19. 7. 17.
 - 권고 : 강조색 및 화강석 색상 조정, 태양광 설치 위치검토(지붕 기와 방안모색)
- 2020년 균특 지방이양사업 예산신청 : '19. 7. 22.
- 신재생에너지 설치면제 신청 : '19. 8. 9.
 - 신재생에너지 이용의무화 대상이나 구림마을은 2006 잘 가꾼 자연·문화유산 (한국내셔널트러스트) 및 한옥보존시범마을(전남도)으로 지정된 지역으로 “입지 조건의 특수성” 으로 신재생에너지 설치면제 신청
- 장애물 없는 생활환경 예비인증 취득(우수등급) : '19. 8. 21.
- 신재생에너지 설치면제 신청 심의(결과: 미허용) : '19. 9. 30.
 - 태양광, 연료전지는 구림한옥마을 및 미술관의 특성을 감안 설비설치의 어려움은 인정
 - 지열은 사업대상지 입지여건과 전기부하량을 고려하여 재심의 요청
- 사업계획 변경 승인(문체부) : '19. 10. 4.
 - 사업기간, 사업규모, 사업비 변경
- 2020년도 균특이양사업 선정(도비 360백만원) : '19. 10. 31.
- 기본 및 실시설계완료 : '19. 11. 1.
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의 신청(2차) : '19. 11. 19.
 - 신재생에너지 설치 면제 심의('19.9.27.) 이후 지열 설치에 대해 재검토
 - 신재생에너지 일부 설치 면제신청(의무비율 27% → 금회 비율 18.5%)

- 전라남도 공사계약심사완료 및 공사 계약체결 : '19. 12. 26.
- 지열 천공에 따른 국가지정 문화재행위허가 신청(결과: 불허) : '19. 12.
 - 지하 50M 이상 굴착행위는 문화재청 불허
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의(결과: 미허용) : '20. 2. 25.
 - 한옥마을 여건상 태양광설치가 어렵다고 하나 법적 규제는 없음
 - 주차장 부분 태양광 설치 및 지하 50M 미만 지열교환기 설치 검토
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의 신청(3차) : '20. 3. 13.
 - 신재생에너지 설치 면제 심의('20. 2. 25) 이후 태양광 및 지열 설치 재검토
 - 지열 지하 50M 10공 천공, 신재생에너지 일부 설치 면제신청
(의무비율 30% → 금회 비율 4.91%)
- 신재생에너지 설치 일부 면제 심의(결과: 적정) : '20. 3. 26.
- 창작교육관 건립공사 착수 : '20. 4. 18.
- 창작교육관 주변정비사업(조경) 착수 : '20. 11. 26.
- 창작교육관 건립공사 완료 : '20. 12. 9.

5-3. 도갑지구 문화공원 조성(추진중)

- 홍예교 설치 및 보행로 정비 착공 : '19. 2.
- 도갑사 옛길복원사업 기본계획 수립용역 완료 : '19. 8.
- 홍예교 설치 및 보행로 정비 완료 : '20. 3.
- 도갑사 옛길복원사업 실시설계용역 : '20. 4.
- 도갑제(수리재골) 탐방로 입지적정성 현장 평가 : '20. 5.
- 도갑사 옛길복원(구림문화길 2200) 계약심사 추진 : '20. 12.
- 도갑사 옛길복원(구림문화길 2200) 사업 추진 : '20. 12.

5-4. 월출산 명사탐방로(風水길) 조성(추진중)

- 명사탐방로 조성을 위한 기초조사 완료 : '18. 3.
 - 견성암, 월출산마애여래좌상, 용암사, 흥개골, 주요명승지 탐방

- 명사탐방로 노선확정을 위한 현장조사 : '19. 2.
- 명사탐방로 조성 시행에 대한 협의(수시) : '19. 3.
- 공원계획변경용역 착수 : '19. 08. ~ 11.
 - 입지적정성평가 신청 ⇒국립공원관리공단(본부) : '19. 9.
- 월출산 국립공원 공원계획변경(안) 제출 : '19. 11.
- 국립공원 내(대동제~용암사지) 대행사업비(실시설계비) 교부 : '19. 12.
- 국립공원 밖(기찬랜드~대동제 구간) 실시설계용역 시행 : '20. 04.
- 탐방로 입지적정성 현장 평가 : '20. 05.
- 월출산 탐방로 공원계획 결정 고시 : '20. 07.
- 명사탐방로 조성사업 추진 : '20. 11.

5-5. 영암 인조잔디 족구장 및 야구장 설치(리모델링)(추진중)

- 영암 인조잔디 족구장 설치
 - 군관리계획 결정 및 실시설계 용역 착수 : '18. 11.
 - 토지 매입(3필지 중 1필지) : '19. 12.
 - 군관리계획 결정 및 지형도면 고시 : '20. 3.
 - 군관리계획 결정 및 실시설계 용역 완료 : '20. 4.
 - 영암 인조잔디 족구장 설치공사 착공 : '20. 6.
 - 미협의 토지(2필지) 수용재결신청(전남도) : '20. 8.
 - 재감정평가 및 토지수용 재결위원회 개최 : '20. 11.
- 영암야구장 인조잔디 설치(완료)
 - 실시설계용역 시행 : '18. 11.
 - 영암야구장 인조잔디 조성공사 추진 완료 : '18. 12. ~ '19. 4.

5-6. 삼호 어울림 문화체육센터(영암군 민속씨름 종합체육센터) 건립(추진중)

- 기본계획 및 타당성 조사용역 시행 : '20. 4. ~ 6.
- 2021 지방체육진흥시설 지원사업 선정 : '20. 7.

- 전남도 지방재정 투자심사 완료 : '20. 8.
- 공유재산 관리계획 반영 : '20. 9.

5-7. 영암읍성 오색스카이웨이 조성(영암 달맞이공원 조성사업) (추진중)

- 기본계획 및 타당성 조사 완료 : '18. 9.
- 달맞이공원 조성 주민설문조사 시행 : '19. 3.
- 지방재정투자심사 완료 (조건부결) : '19. 4.
- 설계공모 추진(☞ 심사결과 당선작 없음 결정) : '19. 6. ~ 11.
- 일반입찰 계약 및 착수 : '20. 1. 3.
- 우수사례지 답사(경상남도 일원) : '20. 5. 28. ~ 29.
- 최종 보고회, 의회 의견수렴, 주민설명회 개최 : '20. 9.
- 문화재 현상변경 심의(보류) : '20. 10. 8.
- 문화재 현상변경 재심의(보류) : '20. 11. 12.
- 문화재 현상변경(안) 자문(2회) : '20. 11. 25, 12. 1.

[6] 깨끗하고 쾌적한 일등영암 만들기(추진율 87%)

추진 현황

- 사업현황 : 8개 사업(완료 4, 추진중 2)
- 투자현황 : 14,459백만원(국비 2,979, 도비 295, 군비 10,485, 기타 700)

6-1. 도로 재비산먼지 제거차량 구입 청정영암 구현(이행 후 계속추진)

- 도로 재비산먼지 청소차량 구입 완료 : '19. 6.
- 대불산단관리사업소로 차량 관리전환 : '19. 7.
- 비산먼지 발생 사업장 주변 집중 운행 : '19. 7. ~ '20. 6.

6-2. 가축분뇨 공공처리시설 개선(이행 후 계속추진)

- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 국비 가내시(100백만원) : '18. 9.
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 실시설계용역 실시 : '19. 2.
- 국고보조금 관련 영산강유역환경청 업무협약 : '19. 3.
 - 당초 사업비 : 925백만원, 실시설계 후 사업비 변경 : 1,060백만원
- 가축분뇨공공처리시설 재원 협의의뢰(한국환경공단) : '19. 3.
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 국고보조금 신청(1,060백만원) : '19. 3.
 - 2019년(1차) : 693백만원(국비 554, 군비 139)
 - 2020년(2차) : 367백만원(국비 294, 군비 73)
- 가축분뇨공공처리시설 재원 협의에 따른 보완사항 제출 : '19. 5.
- 가축분뇨공공처리시설 재원협의 완료(영산강유역환경청) : '19. 7.
 - 총 사업비 확정 : 1,007백만원(국 806, 군 201)
- 가축분뇨공공처리시설 국고보조금 교부 결정 : '19. 7.
 - 2019년 국고보조금 554백만원 교부
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 착공 : '19. 10.
- 가축분뇨공공처리시설 국고보조금 교부 결정 : '20. 3.
 - 2020년 국고보조금 252백만원 교부
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 전기 및 기계 분야 준공 : '20. 4.
- 가축분뇨공공처리시설 개선사업 준공 및 운영 : '20. 4. ~ 계속

6-3. 깨끗하고 쾌적한 영암만들기 운동 전개(추진중)

- 각종 행사대비 주민·사회단체 참여 환경정화활동 전개
 - 설·추석명절, 세계 물의 날 행사, 왕인문화축제, 장애인체전 등 총 13회
 - 읍면 중심으로 기관·사회단체 참여 환경정화활동 실시
- 환경감시원 운영으로 상시 감시체계 강화 : 14명, 1월 ~ 12월
- 민간주도의 환경정화활동 및 캠페인 전개 지원 : 3개 단체, 15백만원

6-4. 사계절 아름다운 꽃길조성 관리 (추진중)

○ 11개 읍·면 계절꽃 식재 및 관리

- 메리골드 등 3종 48,025본 / 97백만원 (2018년)
- 팬지 등 9종 199,447본 / 164백만원 (2019년)
- 전남생활체육대전 꽃길조성지 관수 등 유지관리 / 40백만원 (2019년)
- 국화 등 11종 214,890본 / 158백만원 (2020년)
- 11개 읍·면 꽃길 조성지 관수 등 유지관리 / 11백만원 (2020년)
- 추석맞이 꽃길조성 국화 5,000본/ 20백만원 (2020년)

○ 특색있는 꽃길조성(연 2개소)

- 월출산 진입로, 장천소재지 은행나무길 가로화단 꽃길조성 / 40백만원 (2019년)
- 서호면소재지(구절초 10,000본), 영암읍 쌍정마을 꽃길조성 / 21백만원 (2020년)

○ 주요 관문 관목 및 초화류 식재

- 영암읍 기체육공원 외 5개소, 국화 등 13종 12,570본 / 17백만원 (2018년)
- 영암읍 기찬나눔숲공원 외 4개소, 팬지 등 10종 9,400본 / 7백만원 (2019년)

○ 주요 관문·시가지 관목류 식재 및 보식

- 덕진 영보정 외 1개소 영산홍 4,638주 식재 / 25백만원 (2019년)
- 덕진 영보정 주변 철쭉 3,000주 식재 / 22백만원 (2020년)
- 삼호대교 가로화분 홍가시 등 1,820주 / 40백만원 (2020년)
- 금정 국사봉 등산로 철쭉 2,000주 식재 / 10백만원 (2020년)

○ 주요 행사맞이 꽃길조성

- 2019 영암왕인문화축제 홍보 꽃탑 설치 / 18백만원 (2019년)
- 제27회 장애인체전 대비 꽃탑 및 꽃길 조성 / 40백만원 (2019년)
- 2019 추석장사 씨름대회 꽃길조성 / 29백만원 (2019년)
- 제31회 도 생활대축전 맞이 꽃탑 및 꽃길 조성 / 24백만원 (2019년)

○ 야생화길 조성

- 영암버스터미널 회전교차로 가로화단 야생화 식재 / 11백만원 (2020년)

6-5. 깨끗하고 쾌적한 가로녹지대 조성 관리 (추진중)

- 가로수 연도변 풀베기사업 (2018년) : 300백만원
 - 가로수 연도변 풀베기 342.3km : 100백만원
 - 여름철 가로수 연도변 풀베기 342.3km : 100백만원
 - 추석맞이 가로수 연도변 풀베기 342.3km : 100백만원

- 명품 가로숲 조성사업 8건 (2018년) : 800백만원
 - 삼호 녹색로 중앙분리대 경관숲 조성사업 : 183백만원
 - 지방도 819호선 중앙분리대 경관숲 조성사업 : 150백만원
 - 시종 정동마을 ~ 신항마을 가로수 식재사업 : 87백만원
 - 영암IC교차로 ~ 족자동마을 가로수 식재사업 : 87백만원
 - 기찬랜드 ~ 덕진초교 사거리 가로수 식재사업 : 78백만원
 - 군서 월곡 ~ 미암 선황 가로수 보식사업 : 77백만원
 - 삼호 (구)과적검문소 주변 가로경관숲 조성사업 : 72백만원
 - 춘양교차로 ~ 우정회관 가로수 식재사업 : 66백만원

- 가로수 가지치기 및 전정사업 5건 (2018년) : 193백만원
 - 국도 13호선 소나무 전정사업 : 80백만원
 - 읍면 시가지 내 대형가로수 전정사업 : 69백만원
 - 가로수 및 가로화단 소나무 전정사업 : 36백만원
 - 삼호 금호아파트 진입로 가로수 전정사업 : 4백만원
 - 삼호 중공업 진입로 주변 가로수 전정사업 : 4백만원

- 가로수 연도변 풀베기사업 (2019년) : 356백만원
 - 여름철 가로수 연도변 풀베기 344km : 115백만원
 - 여름철 가로수 연도변 풀베기(2차) 231.3km : 77백만원
 - 추석맞이 가로수 연도변 풀베기 306.8km : 102백만원
 - 제31회 전남생활체전 맞이 가로수 연도변 풀베기 84.1km : 62백만원

- 명품 가로숲 조성사업 7건 (2019년) : 599백만원
 - 상호 녹색로 명품가로숲 조성사업 : 199백만원
 - 시종면 만수리 삼거리 ~ 나주시 반남경계 가로수 식재사업 : 199백만원
 - 신학 보건진료소 ~ 도포명당마을 가로수 식재사업 : 79백만원
 - 금정 대봉감 가로숲 식재사업 : 44백만원
 - 서호 월평마을 가로수 식재사업 : 37백만원
 - 미암 월창마을 가로숲 조성사업 : 22백만원
 - 천황사 교차로 ~ 천황사 삼거리 가로수 보식사업 : 19백만원

- 가로수 가지치기 및 전정사업 7건 (2019년) : 196백만원
 - 상호 도시숲 전정사업 : 44백만원
 - 상호 금호아파트 진입로 가로수 전정사업 : 37백만원
 - 구림 전통숲 조성지 전정사업 : 29백만원
 - 도갑사 진입로 전정사업 : 22백만원
 - 수목 전정 및 정비작업 : 22백만원
 - 군서 전통숲 조성지 일원 태풍 피해 복구 사업 : 21백만원
 - 국도 13호선 ~ 지방도 819호선 가로수 태풍 피해 복구사업 : 21백만원

- 가로수 연도변 풀베기사업 3건 (2020년) : 417백만원
 - 가로수 연도변 풀베기 (1차) : 138백만원
 - 여름철 가로수 연도변 풀베기 (2차) : 138백만원
 - 추석맞이 가로수 연도변 풀베기 (3차) : 141백만원

- 명품 가로숲 조성사업 8건 (2020년) : 276백만원
 - 학산 금계로 가로수 식재사업 : 70백만원
 - 도포 서릿등로 ~ 유호정마을 가로수 식재사업 : 64백만원
 - 상호 가로화분 관목류 보식사업 : 40백만원
 - 시종 갈곡마을 가로경관 조성사업 : 30백만원
 - 난전리 검길마을 가로수 식재사업 : 63백만원

- 상호 녹색로 중앙분리대 경관숲 조성사업 실시설계 용역 : 9백만원
- 상호 녹색로 중앙분리대 경관숲 조성사업 : 196백만원
- 서호면 장천리 가로수(이팝나무) 식재사업 : 20백만원

○ 가로수 가지치기 및 전정사업 16건 (2020년) : 312백만원

- 국도 2호선 가시나무 전정사업 : 73백만원
- 군서 오산 ~ 영암종합운동장 홍가시나무 전정사업 : 22백만원
- 군 청사 주변 관목류 전정 및 보식 사업 : 19백만원
- 금정면 느티나무 가로수 전정사업 : 19백만원
- 상호 금호아파트 ~ 대불공원 느티나무 전정사업 : 19백만원
- 금정면 은행나무 가로수 전정사업 : 16백만원
- 군 청사 주변 전정사업 : 13백만원
- 신북면 소재지 메타세쿼이아 전정사업 : 11백만원
- 상호 한마음어린이집 주변 정비사업 : 9백만원
- 상호 대불주거로 로터리 가로수 정비사업 : 2백만원
- 가로수 주변 노면 정리를 위한 장비임차 : 3백만원
- 국도 13호선 소나무 전정사업 : 70백만원
- 지방도 819호선 중앙분리대 풀베기(제초) 사업 : 14백만원
- 신북면 모산리 메타세쿼이아 가로수 전정 사업 : 7백만원
- 2020년 가로수(금정 대봉감) 관리 일상경비 교부 : 15백만원
- 영암읍 소재지 가로수 전정사업 : 15백만원

6-6. 미암 명품숲 조성(추진완료)

- 기존 수목 전정, 잡관목 제거 : '19. 2. 15.
- 명품숲 실시설계 : '19. 7.
- 명품숲 착공 : '19. 11.
- 미암 명품숲 조성 및 관리 1차 : '20. 5.
- 60백만원(군비 100%)

- 미암 서울농장 명품숲 2차 실시 설계 용역 : '20. 6. ~ 7.
- 미암 서울농장 명품숲 2차 조성 및 관리 : '20. 9. ~ 11.
- 200백만원(군비 100%)

6-7. 미암 서울농장 조성(추진완료)

- 서울농장 기본 및 운영방안 연구용역 완료 : '18. 12. 10.
- 서울농장 조성 균특 10억원 본예산 반영 : '18. 12. 31.
- 미암서초교 폐교부지 철거 완료 : '19. 4. 8.
- 서울농장 운영비 160백만원 확정 및 교부 : '19. 5. 22.
- 실시설계 완료 : '19. 7. 10
- 서울농장 시범운영(4회) : '19. 8.
- 건축 입찰 및 공사 착공 : '19. 11. 12.
- 영암 서울농장관련 조례 제정 : '19. 12.
- 서울농장 운영비 확보(서울시비160백만원) : '20. 2.
- 건축공사 시행 및 주변 정비공사 : '20. 5.
- 운영에 따른 민간위탁체 선정 : '20. 6.
- 영농체험학습장(온실하우스 2동) 조성 : '20. 6. ~ 8.
- 영암 서울농장 운영시작 : '20. 7.
- 농정원 위탁 농업일자리 탐색교육(4회 74명) : '20. 7. ~ 10.
- 도시민 농촌체험프로그램 운영(4회 82명) : '20. 10. ~ 11.

6-8. 영암군 기록관 건립(추진완료)

- 2018년 제3차 영암군 공유재산심의위원회 심의 완료 : '18. 11.
- 2019년 정기분 공유재산 관리계획 반영 : '18. 12.
- 기록관 건립 부지 매입 및 등기 이전 완료 : '19. 2.
- 신안군 기록관 선진지 견학(총무과장 외 3) : '19. 4.

- 기록관 건립공사 기본 및 실시설계용역 완료 : '19. 10.
- 기록관 건립공사 발주 및 착공 : '19. 12.
- 기록관 건립공사 준공 : '20. 8.
- 기록관 이동식서가 및 향온향습기 설치 완료 : '20. 8.
- 기록관 물품 및 장비 구입 및 배치 : '20. 11.
- 기록관 사용승인 : '20. 11.
- 분청 보존서고 및 실과 기록물 이관 완료 : '20. 12.
- 기록관 개관 : '20. 12.

(7) 조화롭고 활기 넘치는 지역균형 발전(추진율 95%)

추진 현황

- 사업현황 : 6개 사업(완료 4, 추진중 2)
- 투자현황 : 24,381백만원(국비 10,041, 도비 707, 군비 10,851, 기타 2,782)

7-1. 마한문화공원 조성(내동리 쌍무덤 발굴)(추진중)

- 내동리 쌍무덤 1차 발굴조사 : '18. 3. ~ 7.
 - 쌍무덤의 축조 공정 및 단계·형태 확인, 제형(사다리꼴) 또는 장타원형으로 추정
- 내동리 쌍무덤 2차 발굴조사 : '19. 1. ~ 8.
 - 금동관편, 대도 2점, 석실2기, 석곽 2기, 옹관 1기 등 많은 유물 출토
- 학술 자문회의 의견 수렴(총3회) : '19. 7. ~ 8.
 - 주구에 대한 조사 선행 후 상부의 석실, 석곽, 옹관 등에 대한 조사 실시(문화재청)
- 내동리 쌍무덤 3차 발굴조사 착수 : '19. 9.
 - 매장주체부 조사 중 금동관 출토
- 내동리 쌍무덤 3차 발굴조사 : '19. 9. ~ '20. 11.
 - 매장주체부 조사 중 금동관 출토

7-2. 무화과 산업특구 전략 추진(추진중)

- '18년 : 4개 분야, 15개 사업 추진(3,610백만원)
 - 무화과 간이집하장 시설확충, 무화과 총채벌레 병과수매 지원사업 등
- '19년 : 4개 분야, 14개 사업 추진(3,035백만원)
 - 무화과 병과수매, 무화과 저온시설확충, 연구개발 등
 - 2018년 무화과 특구 평가 : 우수특구지정 (전국 199개중 12개소선정)
- '20년 : 4개 분야, 14개 사업 추진 중(1,388백만원)
 - 과수고품질시설현대화, 무화과 재해보험료 등

7-3. 농산물 종합가공지원센터 건립(추진완료)

- 농산물 종합가공센터 시설물(811.12m²) 준공 : '18. 9.
- 종합가공센터 오·폐수처리시설(72.8m²) 설치 : '18. 9.
- 종합가공센터 가공장비 구입(68종 104점) : '19. 3.
 - 습식라인 : 음료, 잼, 절임 등 36종 46점
 - 건식라인 : 분말, 환, 포장기 등 26종 28점
 - 기타장비 : 위생장비 등 5종 30점
- 종합가공센터 하자보수(내부 및 오폐수 시설) 3회 : '19. 9.
- '19년 농산물 가공 관련 교육 실시 : 339회(573명)

7-4. 신북면 농촌중심지 활성화사업 추진(추진완료)

- 신북면 농촌중심지 활성화사업 사업 착수 : '18. 7.
 - Happy 문화센터, 메타쉐콰이어길 조성, 신북나들썬터 공사 착공
- 농촌중심지활성화사업 운영법인 설립 : '19. 12.
- 농촌중심지활성화사업 Happy문화센터 개관 : '19. 12.
- 농촌중심지활성화사업 시설물 운영법인 관리전환 : '19. 12.

7-5. 도포권역 종합정비사업 추진(추진완료)

- 활성화센터, 풋살장, 명당휴식공원, 무선방송시스템 완료 : '18. 12.
- 건강관리실 리모델링공사 완료 : '19. 4.
- 소득사업 추진법인 구성 : '19. 10.
- 소득사업 실시설계용역 착수 : '19. 11.
- 도포권역 종합정비사업 준공 : '19. 12.
- 시설물 운영관리 협약 체결(영암군, 권역운영위원회) : '19. 12.

7-6. 금정지구 농어촌 지방상수도 개발(추진완료)

- 냉천·백운·식산마을 상수도 공급 완료 : '19. 1.
- 인곡·지초·백마마을 상수도 공급 완료 : '19. 12.
