

목 표

- 서울농장 주변 명품숲을 조성하여 방문객들에게 쉼터 및 커뮤니티 공간 등을 제공
- 사계절 푸르고 꽃이 피는 명품숲 조성으로 경관 향상에 기여

추진진도	미착수 <input type="checkbox"/>	추진율 (100%)	완료시기	임기내 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/>
	추진중 <input type="checkbox"/>			임기후 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		시군 <input checked="" type="checkbox"/>
사업시기	2019년~2020년 (2개년)		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
				260	-	-	260	-	

현황 및 사업개요

- 사업기간 : 2019. 2월 ~ 2020. 12월
- 위 치 : 미암면 호포리 83
- 사업내용 : 기존 수목 전정, 잡관목 제거, 상록수 및 화목류 식재 벤치 등 편의시설 설치
- 총사업비 : 260백만원(군비 100%) * 1차 60백만원, 2차 200백만원

세부 추진계획


년도	세부사업명	세부추진내용
2019	미암 명품숲 조성	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기존 수목 전정, 잡관목 제거 : 2. 15.限 ▪ 명품숲 실시설계(1차) : 10. 24.限
2020	미암 명품숲 조성	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 미암 명품숲 조성 및 관리(1차) : 5. 17.限 ▪ 미암 명품숲 실시설계(2차) : 7. 31.限 ▪ 미암 명품숲 조성 및 관리(2차) : 12. 30.限

추진실적

- 기존 수목 전정, 잡관목 제거 : '19. 2월
- 명품숲 실시설계 : '19. 7월
- 명품숲 착공 : '19. 11월
- 미암 명품숲 조성 및 관리 1차(60백만원) : '20. 5월

- 미암 서울농장 명품숲 2차 실시 설계 용역 : '20. 6월 ~ 7월
- 미암 서울농장 명품숲 2차 조성 및 관리(200백만원) : '20. 9월 ~ 11월

관련사진

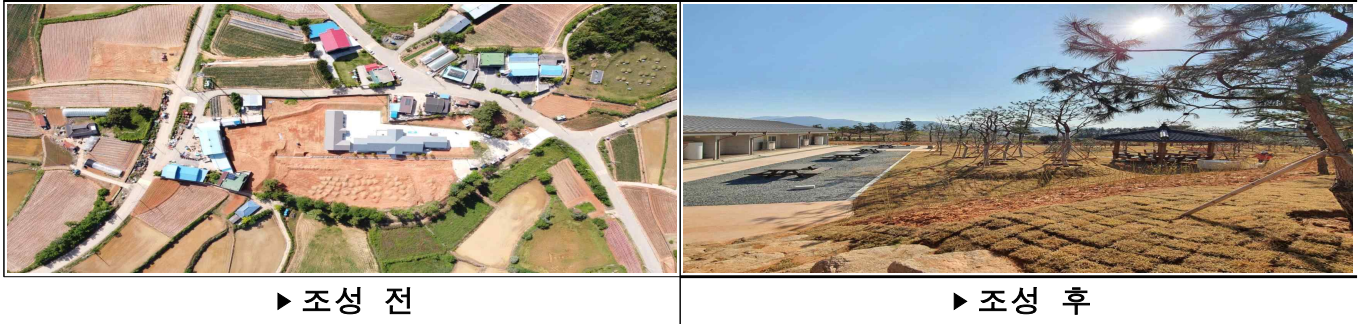

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투 자 계 획					임기후	투 자 실 적					임기후
		'18	'19	'20	'21	'22		'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	260	-	60	200	-	-	-	-	60	213	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	260	-	60	200	-	-	-	-	60	213	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 확인지표

지표명	지표 목표				
	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
미암 명품숲 조성	-	명품숲 실시설계	명품숲 조성 및 관리	-	-
목표달성 여부	-	여	여		

기대효과

- 서울농장 방문객들에게 쉼터 및 커뮤니티 공간 제공으로 효율적인 농장운영
- 명품숲 조성으로 서울농장 방문객 및 지역 주민에게 쾌적한 녹색복지 실현으로 삶의 질 향상

주관부서	과 장		팀 장		담당자	
산림해양과	방정채	2340	류동식	2216	윤선웅	2022
